



BÁO CÁO TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

ASMS – Tiến độ theo UC

Tiến độ theo Use Case – chức năng hoạt động là hoàn thành
Phạm vi 152 UC · 15 phân hệ vận hành


Thời gian triển khai: 05/05/2026 → 20/06/2026

Mục lục

01	Tổng quan biểu đồ
02	Roadmap triển khai (05/05 – 20/06)
03	Tiến độ theo nhóm nghiệp vụ
04	Phân bổ trạng thái UC
05	Chi tiết từng phân hệ
06	Chú giải & nguồn dữ liệu

1. Tổng quan biểu đồ

Tiến độ = % UC hoạt động (kiểm thử đạt: pass, manual, no_data). Không tính audit màn hình.



2. Roadmap triển khai


Lộ trình thực hiện 152 UC từ 05/05/2026 đến 20/06/2026.

Giai đoạn triển khai: 05/05/2026 → 20/06/2026 (47 ngày làm việc · 152 UC)

05/05/2026Tháng 5 / 2026Tháng 6 / 202620/06/2026



Roadmap triển khai ASMS (05/05 - 20/06/2026)

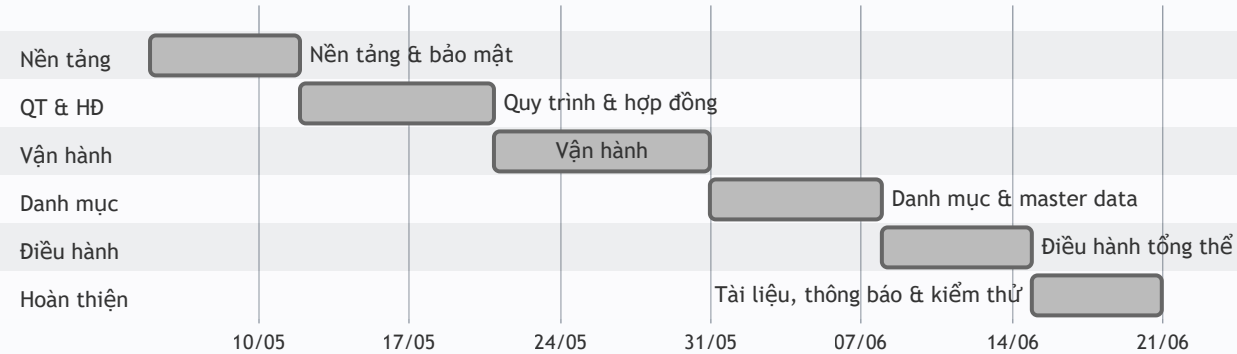

2. Roadmap triển khai (chi tiết)

05/05 – 11/05 ✓ Hoàn thành Nền tảng & bảo mật Đăng nhập, phiên, RBAC, cài đặt hệ thống 18 UC · Nền tảng & bảo mật	12/05 – 20/05 ✓ Hoàn thành Quy trình & hợp đồng Workflow, hợp đồng, tab điều khoản 34 UC · Quy trình & hợp đồng
21/05 – 30/05 ✓ Hoàn thành Vận hành Bàn giao, HL, bảo hành, phản ánh 38 UC · Vận hành	31/05 – 07/06 ✓ Hoàn thành Danh mục & master data Sản phẩm, vật tư, khách hàng CRM 29 UC · Danh mục & master data
08/06 – 14/06 ✓ Hoàn thành Điều hành tổng thể Dashboard 11 tab, báo cáo xuất file 20 UC · Điều hành tổng thể	15/06 – 20/06 ✓ Hoàn thành Tài liệu, thông báo & kiểm thử Tài liệu, thông báo, smoke test 152 UC 13 UC · Tài liệu & thông báo

Thời gian	Giai đoạn	Đầu ra chính	UC	Trạng thái
05/05 – 11/05	Nền tảng & bảo mật	Đăng nhập, phiên, RBAC, cài đặt hệ thống	18	Hoàn thành
12/05 – 20/05	Quy trình & hợp đồng	Workflow, hợp đồng, tab điều khoản	34	Hoàn thành
21/05 – 30/05	Vận hành	Bàn giao, HL, bảo hành, phản ánh	38	Hoàn thành
31/05 – 07/06	Danh mục & master data	Sản phẩm, vật tư, khách hàng CRM	29	Hoàn thành
08/06 – 14/06	Điều hành tổng thể	Dashboard 11 tab, báo cáo xuất file	20	Hoàn thành
15/06 – 20/06	Tài liệu, thông báo & kiểm thử	Tài liệu, thông báo, smoke test 152 UC	13	Hoàn thành

3. Tiến độ theo nhóm nghiệp vụ

6 nhóm – % trung bình có trọng số theo số UC.

Nền tảng & bảo mật

100%

Xác thực

100%

7/7 UC

Cài đặt

100%

11/11 UC

Điều hành tổng thể

100%

Dashboard

100%

11/11 UC

Báo cáo

100%

9/9 UC

Quy trình & hợp đồng

100%

Quy trình

100%

13/13 UC

Hợp đồng

100%




14/14 UC

HĐ – Điều khoản


100%

7/7 UC

3. Tiến độ theo nhóm nghiệp vụ (tiếp)

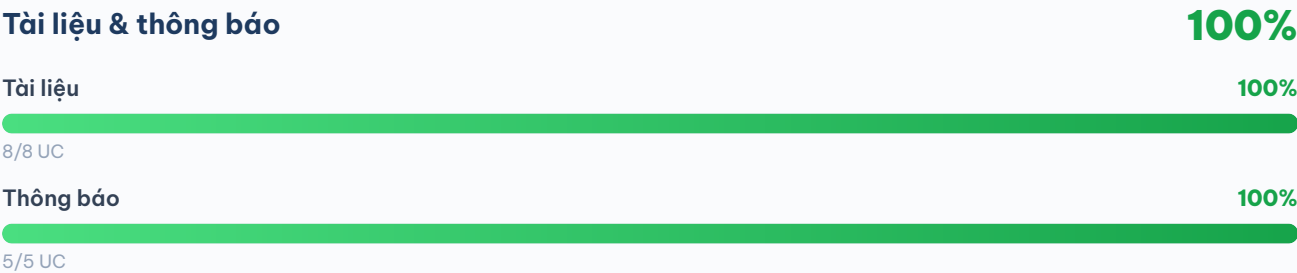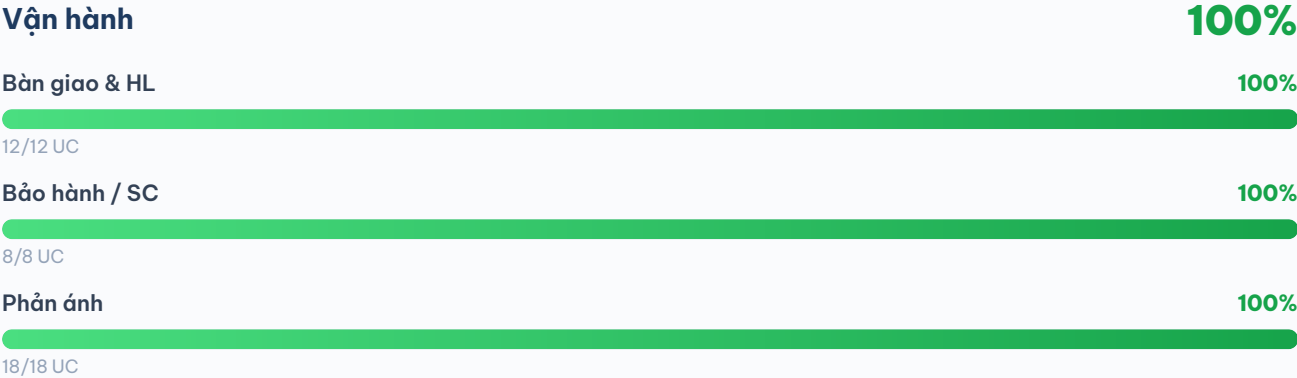

4. Phân bổ trạng thái UC

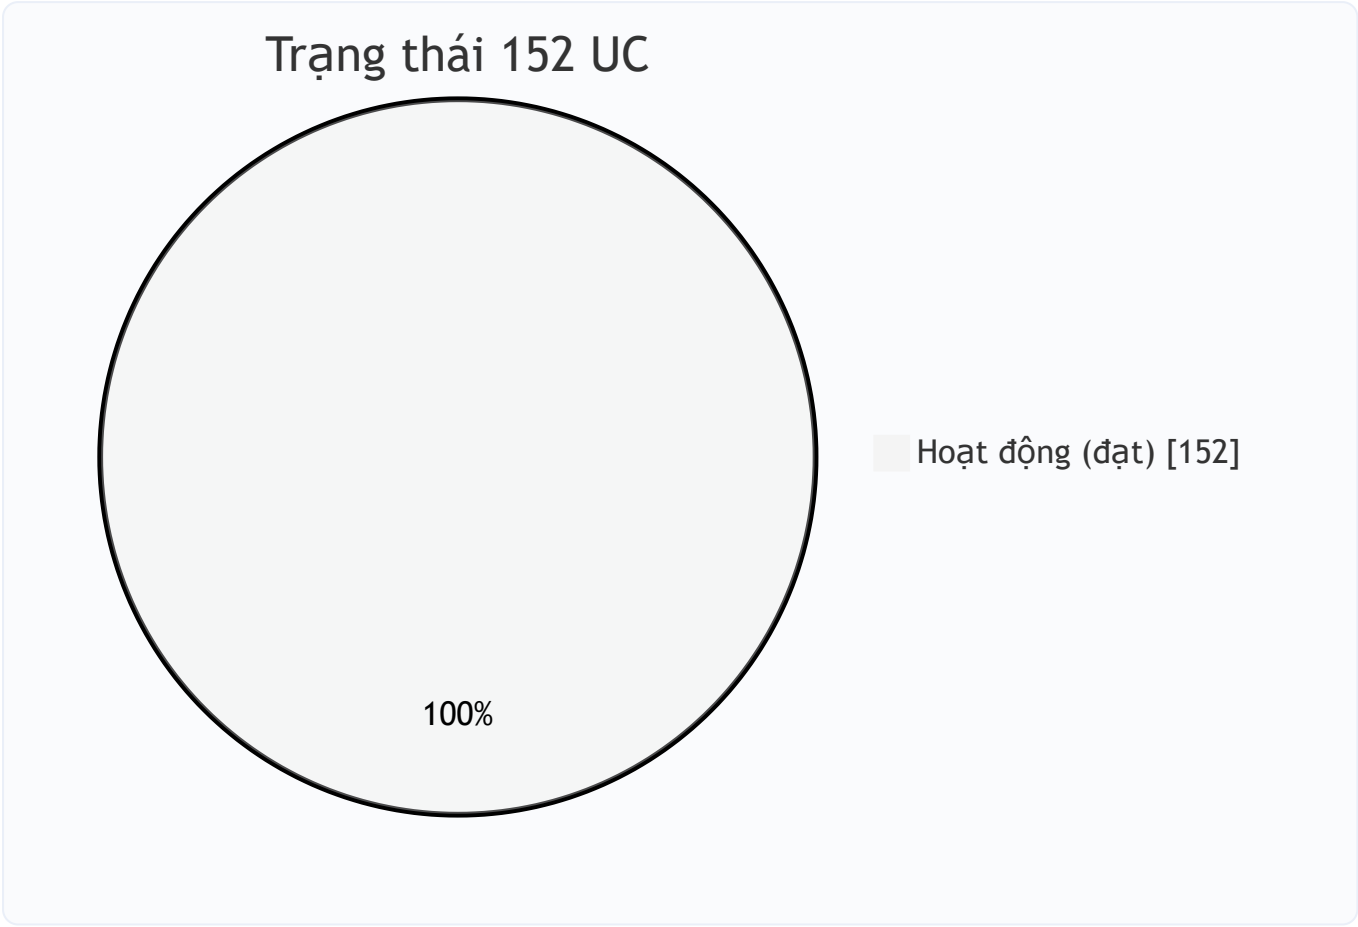

5. Chi tiết từng phân hệ

Bảng đầy đủ 15 phân hệ – 152 UC.

Phân hệ	Module	UC đạt	Tiến độ
Xác thực	AUTH	7/7	100%
Dashboard	dashboard	11/11	100%
Quy trình	quy-trinh	13/13	100%
Hợp đồng	hop-dong	14/14	100%
HĐ – Điều khoản	hop-dong.dieu-khoan	7/7	100%
Bàn giao & HL	ban-giao	12/12	100%
Bảo hành / SC	bao-hanh	8/8	100%
Phản ánh	phan-anh	18/18	100%
Khách hàng	khach-hang	9/9	100%
Sản phẩm	san-pham	12/12	100%
Vật tư	vat-tu	8/8	100%
Báo cáo	bao-cao	9/9	100%
Tài liệu	tai-lieu	8/8	100%
Cài đặt	cai-dat	11/11	100%
Thông báo	thong-bao	5/5	100%

6. Chú giải & nguồn dữ liệu

- 100% – Tất cả UC phân hệ hoạt động
- 75-99% – Còn UC chưa đạt
- 50-74% – Đang triển khai
- < 50% – Ưu tiên bổ sung

Đạt = trạng thái pass, manual hoặc no_data trong ma trận kiểm thử.

Phân hệ	UC đạt	Tiến độ
Xác thực	7/7	100%
Dashboard	11/11	100%
Quy trình	13/13	100%
Hợp đồng	14/14	100%
HD – Điều khoản	7/7	100%
Bàn giao & HL	12/12	100%
Bảo hành / SC	8/8	100%
Phản ánh	18/18	100%
Khách hàng	9/9	100%
Sản phẩm	12/12	100%
Vật tư	8/8	100%
Báo cáo	9/9	100%
Tài liệu	8/8	100%
Cài đặt	11/11	100%
Thông báo	5/5	100%
